

中山市天图精细化工有限公司防晒喷雾（防晒乳）、保湿喷雾、沐浴慕斯、干发喷雾、标记漆、鞋袜喷雾、空气清新剂、发胶喷雾、发彩和润滑剂喷雾改扩建项目竣工环境保护验收意见

2025 年 4 月 26 日，中山市天图精细化工有限公司根据《中山市天图精细化工有限公司防晒喷雾（防晒乳）、保湿喷雾、沐浴慕斯、干发喷雾、标记漆、鞋袜喷雾、空气清新剂、发胶喷雾、发彩和润滑剂喷雾改扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

中山市天图精细化工有限公司位于中山市三角镇金鲤工业区迪源路 28 号（中心坐标：东经 113°23'59.977，北纬 22°40'47.394"）。用地面积 13189.3 平方米，建筑面积为 9478.3 平方米。主要研发、生产、销售：化工产品（不含危险化学品），发用类及护肤类化妆品、气溶胶（消毒品类气雾剂）、溶剂稀释型防锈油、皮革光亮剂、丙烯酸酯类树脂涂料、气溶胶（化妆品类气雾剂）、乙醇溶液（按体积含乙醇大于 24%）、消毒产品。

（二）建设过程及环保审批情况

中山市天图精细化工有限公司委托广州成达生态环境技术有限公司于 2024 年 8 月编制完成了《中山市天图精细化工有限公司防晒喷雾（防晒乳）、保湿喷雾、沐浴慕斯、干发喷雾、标记漆、鞋袜喷雾、空气清新剂、发胶喷雾、发彩和润滑剂喷雾改扩建项目环境影响报告表》，并于 2024 年 9 月 24 日取得中山市生态环境局批复，批复文号为：中（角）环建表（2024）0044 号。项目竣工日期 2024 年 10 月 15 日，调试起止日期：2024 年 10 月 15 日~2025 年 5 月 31 日。企业于 2025 年 3 月 6 日取得排污许可证，证书编号：91442000799322632J001X。项目竣工调试，与项目配套的环保设施已建成并投入使用，环保设施运行正常，具备环境保护竣工验收条件。

（三）投资情况

项目设计总投资 4000 万元，环保投资设计 100 万元；项目实际总投入 4000 万元，实际环保投资 100 万元。

验收组签名：

林子忠

李旭

李松

何玉霞

李松

第 1 页 共 9 页

（四）验收范围

根据《中山市天图精细化工有限公司防晒喷雾（防晒乳）、保湿喷雾、沐浴慕斯、干发喷雾、标记漆、鞋袜喷雾、空气清新剂、发胶喷雾、发彩和润滑剂喷雾改扩建项目环境影响报告表》及其批复【中（角）环建表〔2024〕0044号】确定的内容，项目整体验收，项目建设内容见表1、表2、表3：

表1、项目主要生产设备一览表

序号	设备名称	型号	环评审批数量	验收数量	对应工艺	备注
1.	均质乳化锅	1T	7 个	7 个	均质乳化工序	用电
		2T	2 个	2 个		
		3T	3 个	3 个		
		0.05T	1 个	1 个		
2.	搅拌配制锅	0.5T	1 个	1 个	混合搅拌工序	
		1T	1 个	1 个		
		2T	3 个	3 个		
3.	自动气雾剂灌装充填线	20 米，每条线设有 1 台罐料机，1 台放钢珠机，1 台充气机，1 条水浴槽，1 台自动称重机，1 台自动上阀机，1 台自动上盖机，1 台喷码机，1 台封箱机	8 条	8 条	充料、充气体工序	
4.	液体灌装线	20 米，每条线设有 1 台罐料机，1 台放钢珠机，1 台充气机，1 条水浴槽，1 台自动称重机，1 台自动上阀机，1 台自动上盖机，1 台喷码机，1 台封箱机	4 条	4 条	充填工序	
5.	水乳灌装线	设有 1 台罐料机、1 台压塞拧泵头一体机、1 台喷码机、1 台封箱机	1 条	1 条	充填工序	
6.	蒸汽包装线	生产线约长 11 米 设有 1 台套膜机，1 台蒸汽收缩机（带用电锅炉），1 台封箱机	3 条	3 条	人工包装工序	
7.	热收缩生产线	每条设有 1 台套膜机，1 台热收缩机，1 台封箱机	3 条	3 条	人工包装工序	

验收组签名：林强 郭少华 梁春宏 何玉霞 第 3 页 共 9 页 邓惠生

8.	吨桶	1 吨	145 个	145 个	原料、产 品暂存
9.	拉缸	0.9 吨	8 个	8 个	
		0.8 吨	11 个	11 个	
		0.5 吨	11 个	11 个	
10.	高速分散机	JB11	3 台	3 台	均质搅拌 工序
11.	纯水机	5 吨/小时	1 台	1 台	制备纯水
12.	空压机	UDT110A-8VPM	3 台	3 台	辅助设 备，共用
13.	真空泵	ZB-760	4 台	4 台	
14.	过滤器	//	4 台	4 台	
15.	料液气动输送泵	QZY-100	3 台	3 台	
16.	气液气动泵	QZY-80/QZY-63	9 台	9 台	
17.	射码机	9200	9 台	9 台	
18.	气相色谱仪	//	1 台	1 台	
19.	磅秤	//	11 台	11 台	
20.	电子秤	//	10 台	10 台	
21.	台秤	//	3 台	3 台	
22.	叉车	//	9 台	9 台	
23.	高低压变电柜	10KV-200V/380V	2 台	2 台	
24.	电锅炉	LDZ(K)(0.1-0.2t/h) -0.8	3 台	3 台	人工包装 工序(蒸 汽包装线 内包含 的)

表2、项目主要原辅材料及年用量一览表

序号	名称	环评批复数量 (t)	验收数量 (t)	最大储存量 (t)	包装方式	所在工序
1	甲醇	10	10	0.2	桶装, 25kg/桶	投料
2	煤油	137.5	137.5	1	桶装, 25kg/桶	投料
3	乙醇[无水]	482.5	482.5	1	桶装, 25kg/桶	投料
4	丙烯酸树脂	8.5	8.5	0.5	桶装, 25kg/桶	投料
5	6#溶剂油	20	20	0.2	桶装, 25kg/桶	投料
6	201 甲基硅油	5	5	0.1	桶装, 25kg/桶	投料
7	68#机械油	12	12	0.1	桶装, 25kg/桶	投料
8	香精	23.06	23.06	1	桶装, 25kg/桶	投料
9	石油醚	45	45	0.5	桶装, 25kg/桶	投料
10	二甲醚	46	46	0.31	桶装, 25kg/桶	投料
11	芳烃油	10	10	0.1	桶装, 25kg/桶	投料
12	异己烷	30	30	0.3	桶装, 25kg/桶	投料
13	环己烷	50	50	0.4	桶装, 25kg/桶	投料
14	甘油 (多元醇)	5	5	0.5	桶装, 25kg/桶	投料
15	抗氧化剂 BHT	2.001	2.001	0.1	桶装, 25kg/桶	投料
16	表面活性剂	5	5	0.5	桶装, 25kg/桶	投料
17	防腐剂	3	3	0.1	桶装, 25kg/桶	投料

验收组签名:

林子宁

吴如

李红

何玉霞

第 3 页 共 9 页

邓立新

18	水杨酸辛酯(防晒剂)	20	20	0.5	桶装, 25kg/桶	投料
19	芦荟提取液	5	5	0.5	桶装, 25kg/桶	投料
20	纯水	4031.57	4031.57	/	/	投料
21	水性油墨	0.21	0.21	0.01	桶装, 20kg/桶	喷码
22	异十二烷	20	20	0.5	桶装, 25kg/桶	投料
23	奥克立林	20	20	0.5	桶装, 25kg/桶	投料
24	甲氧基肉桂酸乙基己酯	5	5	0.3	桶装, 25kg/桶	投料
25	丁二醇	380	380	2	桶装, 25kg/桶	投料
26	辛酸/癸酸甘油三酯	40	40	0.5	桶装, 25kg/桶	投料
27	椰油酰胺丙基羟基磺基甜菜碱	40	40	2	桶装, 25kg/桶	投料
28	椰油酰氨基丙酸钠	20	20	1	桶装, 25kg/桶	投料
29	月桂基葡萄糖苷	20	20	0.5	桶装, 25kg/桶	投料
30	丙二醇	45	45	0.5	桶装, 25kg/桶	投料
31	辛基丙烯酰胺丙烯酸(酯)类甲基丙烯酸丁氨基乙酯共聚物	9.02	9.02	0.1	桶装, 25kg/桶	投料
32	氨甲基丙醇	3	3	0.06	桶装, 25kg/桶	投料
33	石油磺酸钡	12.5	12.5	0.2	桶装, 25kg/桶	投料
34	DC-100CST 硅油	7.5	7.5	0.05	桶装, 25kg/桶	投料
35	十二烷基二甲基苄基氯化铵	1	1	0.01	桶装, 25kg/桶	投料
36	吐温-20	5	5	0.1	桶装, 25kg/桶	投料
37	脱芳烃类溶剂油	25.59	25.59	0.16	桶装, 25kg/桶	投料
38	液化石油气	410.72	410.72	2	瓶装, 45kg/瓶	投料
39	二氧化碳	118.1	118.1	0.45	瓶装, 20kg/瓶	辅助
40	氮气	40	40	0.5	瓶装, 7kg/瓶	辅助
41	苯基苯并咪唑磺酸	5	5	0.1	袋装, 20kg/袋	投料
42	海藻糖	40	40	1	袋装, 20kg/袋	投料
43	淀粉辛烯基琥珀酸铝	12	12	0.1	袋装, 20kg/袋	投料
44	硅石	12.04	12.04	0.1	袋装, 20kg/袋	投料
45	钛白粉	15	15	0.1	袋装, 20kg/袋	投料
46	色粉	2.52	2.52	0.1	袋装, 20kg/袋	投料

验收组签名: 林子宇

张如 李浩 何玉霞

邓克

47	热收缩膜 (PVC)	2	2	0.5	捆扎	包装
48	机油	0.1	0.1	0.01	桶装, 25kg/桶	辅助

表3、项目主要产品产量一览表

序号	产品名称	规模 (万罐)	
		环评审批产量	验收年产量
1	皮革光亮剂	80	80
2	溶剂稀释型防锈油	80	80
3	气溶胶 (消毒品类气雾剂)	150	150
4	气溶胶 (化妆品类气雾剂)	600	600
5	防晒喷雾 (防晒乳)	850	850
6	保湿喷雾	500	500
7	沐浴慕斯	150	150
8	干发喷雾	12	12
9	标记漆	16	16
10	鞋袜喷雾	100	100
11	空气清新剂	80	80
12	发胶喷雾	12	12
13	发彩	10	10
14	润滑剂喷雾	60	60

二、工程变更情况

本项目建设内容与环评及批复基本一致, 无变动。

三、环境保护设施建设情况

(一) 废水

1) 生活污水: 项目所产生的生活污水经厂区内三级化粪池预处理后经市政污水管网排入中山市三角镇污水处理有限公司处理;

2) 生产废水: 经自建污水处理站处理达标后排入市政污水管网进入中山市三角镇污水处理有限公司集中治理排放, 治理达标尾水排入洪奇沥水道。

(二) 废气

1) 投料、配置、过滤、静置、充填、混合搅拌、乳化等生产过程废气 (主要污染物为 TVOC、非甲烷总烃、颗粒物、甲醇和臭气浓度) 采取密闭车间正压收集+布袋除尘+二级活性炭吸附+高空排放, 排气筒编号为 FQ-010732;

2) 喷码工序产生的废气采取加强车间通风, 无组织排放;

3) 热收缩过程产生的废气采取加强车间通风, 无组织排放;

4) 自建污水处理站运行过程废气采取定期喷洒除臭剂, 加强管理, 并在污水处理设施周

验收组签名:

林强

林强

林强

何玉霞

第 5 页 共 9 页

林强

边加强绿化措施，无组织排放。

（三）噪声

项目产生的噪声主要为生产过程中设备的运行噪声，包括空压机、料液气动输送泵等生产设备运行时的机械噪声，通过隔声、吸声、减振、消声等措施降低噪声对周围环境影响。

（四）固体废物

项目产生的生活垃圾通过厂内垃圾桶收集并按指定地点堆放，交由当地环卫部门清运处理。一般固体废物：对于制纯水产生的废活性炭、制纯水产生的废砂石、废包装袋（苯基苯并咪唑磺酸、海藻糖、淀粉辛烯基琥珀酸铝、硅石、钛白粉、聚合氯化铝 PAC 和聚丙烯酰胺 PAM）、制纯水生产的废树脂、废 RO 膜、废精过滤器、废布袋和布袋回收粉尘，采取集中收集交由一般工业固体废物处理能力的单位处理。危险废物：废气治理过程产生的饱和活性炭、废油墨桶、制纯水生产的废树脂、废原料包装桶（包括甲醇、6#溶剂油、煤油、乙醇（无水、95%）、丙烯酸树脂、201 甲基硅油、68#机械油、香精、石油醚、二甲醚、芳烃油、异己烷、环己烷、甘油（多元醇）、抗氧化剂 BHT、表面活性剂、防腐剂、水杨酸锌酯（防晒剂）、芦荟提取液、异十二烷、奥克立林、甲氧基肉桂酸乙基己酯、丁二醇、辛酸/癸酸甘油三酯、椰油酰胺丙基羟甲基磺基甜菜碱、椰油酰氨基丙酸钠、月桂基葡糖苷、丙二醇、辛基丙烯酰胺丙烯酸（酯）类甲基丙烯酸丁氨基乙酯共聚物、氨甲基丙醇、石油磺酸钡、DC-100CST 硅油、十二烷基二甲基苄基氯化铵、吐温-20 和脱芳烃类溶剂油）、污泥、废抹布、废机油及其包装物和废色粉包装袋等危险废物委托给珠海汇华环保技术有限公司处理。

（五）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

本项目已按要求编制了突发环境事件应急预案并备案，备案编号为442000-2025-0020-L。

2、在线监测装置

本项目废气排气筒已按要求建设了监测孔、监测平台和监测爬梯，并挂设了排放口标志牌。根据环评及批复，无在线监测要求。

3、其他设施

无。

四、环境保护设施调试效果

根据广东乾达检测技术有限公司出具的《中山市天图精细化工有限公司防晒喷雾（防晒乳）、保湿喷雾、沐浴慕斯、干发喷雾、标记漆、鞋袜喷雾、空气清新剂、发胶喷雾、发彩和润滑剂

验收组签名：

林子宏

郭如 李加云

何玉霞

邓文文

喷雾改扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》表明，验收监测期间各项环境保护设施符合环评报告及批复中的要求。具体如下：

（一）环保设施处理效率

1、废水治理设施

根据环评报告表及批复，对生活污水、生产废水的污染物去除率无要求。

2、废气治理设施

1) 投料、配置、过滤、静置、充填、混合搅拌、乳化等生产过程废气（FQ-010732）采取密闭车间负压收集+二级活性炭+15米高空排放，环保设施运行正常，处理效率和排放浓度均能满足环评报告表及批复要求。

2) 喷码工序产生的废气采取加强车间通风后无组织排放，无组织排放浓度能满足环评报告表及批复要求。

3) 热收缩过程产生的废气采取加强车间通风后无组织排放，无组织排放浓度能满足环评报告表及批复要求。

4) 自建污水处理站运行过程废气采取定期喷洒除臭剂，加强管理，并在污水处理设施周边加强绿化措施，无组织排放，无组织排放浓度能满足环评报告表及批复要求。

3、厂界噪声治理设施

根据环评报告表及批复，对厂界噪声治理设施无降噪效果要求。

4、固体废物治理设施

本项目固体废物集中收集后转移处理。

（二）污染物排放情况

1、废水

监测结果表明：生活污水：经厂内三级化粪池预处理后，废水排放达到《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准。

生产废水：经自建污水处理设施处理后，符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）三级标准（第二时段）。

2、废气

监测结果表明：

有组织废气：投料、配置、过滤、静置、充填、混合搅拌、乳化等生产过程废气 G1：经布袋除尘+二级活性炭吸附处理后，非甲烷总烃符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机

验收组签名：

林少华

吴加

李长松

何玉霞

邓贵平

第 7 页 共 9 页

物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值和《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表 2 大气污染物特别排放限值较严者，颗粒物符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表 2 第二时段二级标准和《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表 2 大气污染物特别排放限值较严者，甲醇符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表 2 第二时段二级标准，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 2 对应排气筒高度恶臭污染物排放标准。

厂界无组织废气：厂界颗粒物、非甲烷总烃甲醇符合广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中无组织排放监控浓度限值（第二时段），总 VOCs 符合广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB/44/814-2010）表 3 无组织排放限值，臭气浓度、硫化氢和氨符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准。

厂区内无组织废气：非甲烷总烃符合广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值。

3、噪声

监测结果表明：项目厂界噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准限值。

4、固体废物

经现场勘察，本项目一般工业固体废物贮存设施的建设基本符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求。

本项目设置了危险废物暂存间，危险废物暂存间的建设基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）相关要求。

5、总量控制要求

根据验收监测报告核算，本项目挥发性有机物实际年排放量符合环评批复的总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

（一）、建设及运营期间未收到周边投诉；

（二）、根据验收监测报告，项目运营期间废水、废气、噪声均达标排放，固体废物贮存符合相关要求，对周边环境影响不大。

六、验收结论

验收组签名：

林强

吴如

李峰

何霞

陈文

第 8 页 共 9 页

验收组认为项目执行了“环境影响评价”和环保“三同时”管理制度，落实了环境影响评价文件及其批复的要求，各项污染物均能稳定达标排放，经验收工作组协商，一致同意中山市天图精细化工有限公司防晒喷雾（防晒乳）、保湿喷雾、沐浴慕斯、干发喷雾、标记漆、鞋袜喷雾、空气清新剂、发胶喷雾、发彩和润滑剂喷雾改扩建项目通过竣工环境保护验收。

七、后续建议要求

- 建议：①、加强环保设施的维护保养和运营管理，确保污染物稳定达标排放。
- ②、加强企业清洁生产管理，增强职工的环保意识；减少工艺过程中的无组织排放；
- ③、要切实执行环境保护“三同时”制度，加强环境事故应急演练。

八、验收工作组成员

姓名	单位	职务/职称	电话	备注
林子良	中山市天图精细化工有限公司	经理	18938706258	建设单位
梁旭	中山市南朗镇水务有限公司	高工	13600333630	专家
李有忠	中山市广世环保技术有限公司	高工	13726055111	专家
邓惠文	广东正检测技术有限公司	技术员	15820833194	技术服务
何玉霞	中山市保美环境科技开发有限公司	技术员	12590779686	技术服务

中山市天图精细化工有限公司
2025 年 4 月 26 日

验收组签名

林子良

梁旭

李有忠

何玉霞

邓惠文

中山市天图精细化工有限公司防晒喷雾（防晒乳）、保湿喷雾、沐浴慕斯、干发喷雾、标记漆、鞋袜喷雾、空气清新剂、发胶喷雾、发彩和润滑剂喷雾改扩建项目竣工环境保护验收其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 项目简况

中山市天图精细化工有限公司位于中山市三角镇金鲤工业区迪源路 28 号（中心坐标：东经 113°23'59.977，北纬 22°40'47.394"）。用地面积 13189.3 平方米，建筑面积为 9478.3 平方米。主要研发、生产、销售：化工产品（不含危险化学品），发用类及护肤类化妆品、气溶胶（消毒品类气雾剂）、溶剂稀释型防锈油、皮革光亮剂、丙烯酸酯类树脂涂料、气溶胶（化妆品类气雾剂）、乙醇溶液（按体积含乙醇大于 24%）、消毒产品。

环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，落实环评及批复要求的防治污染和生态保护措施。

1.2 施工简况

(1) 投料、配置、过滤、静置、充填、混合搅拌、乳化等生产过程废气（主要污染物为 TVOC、非甲烷总烃、颗粒物、甲醇和臭气浓度）采取密闭车间正压收集+布袋除尘+二级活性炭吸附+高空排放，排气筒编号为 FQ-010732；

喷码工序产生的废气采取加强车间通风，无组织排放；

热收缩过程产生的废气采取加强车间通风，无组织排放；

自建污水处理站运行过程废气采取定期喷洒除臭剂，加强管理，并在污水处理设施周边加强绿化措施，无组织排放；

较环评阶段，废气治理设施没有发生变化。

(2) 废水：生活污水：项目所产生的生活污水经厂区内三级化粪池预处理后经市政污水管网排入中山市东凤镇污水处理有限责任公司处理。

生产废水：经自建污水处理站处理达标后排入市政污水管网进入中山市三角镇污水处理有

限公司集中治理排放，治理达标尾水排入洪奇沥水道。

较环评阶段，废气治理设施没有发生变化。

- (3) 噪声：本项目噪声源主要为设备运行过程产生的噪声，建设单位采取隔声、吸声、减振、消声等措施进行噪声防护。

较环评阶段，噪声治理设施没有发生变化。

- (4) 固废：项目产生的生活垃圾通过厂内垃圾桶收集并按指定地点堆放，交由当地环卫部门清运处理。一般固体废物：对于制纯水产生的废活性炭、制纯水产生的废砂石、废包装袋（苯基苯并咪唑磺酸、海藻糖、淀粉辛烯基琥珀酸铝、硅石、钛白粉、聚合氯化铝 PAC 和聚丙烯酰胺 PAM）、制纯水生产的废树脂、废 RO 膜、废精过滤器、废布袋和布袋回收粉尘，采取集中收集交由一般工业固体废物处理能力的单位处理。危险废物：废气治理过程产生的饱和活性炭、废油墨桶、制纯水生产的废树脂、废原料包装桶（包括甲醇、6#溶剂油、煤油、乙醇（无水、95%）、丙烯酸树脂、201 甲基硅油、68#机械油、香精、石油醚、二甲醚、芳烃油、异己烷、环己烷、甘油（多元醇）、抗氧剂 BHT、表面活性剂、防腐剂、水杨酸锌酯（防晒剂）、芦荟提取液、异十二烷、奥克立林、甲氧基肉桂酸乙基己酯、丁二醇、辛酸/癸酸甘油三酯、椰油酰胺丙基羟基磺基甜菜碱、椰油酰氨基丙酸钠、月桂基葡糖苷、丙二醇、辛基丙烯酸胺丙烯酸（酯）类甲基丙烯酸丁氨基乙酯共聚物、氨甲基丙醇、石油磺酸钡、DC-100CST 硅油、十二烷基二甲基苄基氯化铵、吐温-20 和脱芳烃类溶剂油）、污泥、废抹布、废机油及其包装物和废色粉包装袋等危险废物委托给珠海汇华环保技术有限公司处理。

较环评阶段，固体废物治理设施没有发生变化。

1.3 验收过程简况

本项目验收过程见表 1。

表 1 验收过程一览表

项目	内容
建设项目竣工时间	2024 年 10 月 15 日
验收工作启动时间	2024 年 10 月 15 日
自主验收方式	委托中山市保美环境科技开发有限公司作为技术服务单位。
委托合同和责任约定的关键内容	广东乾达检测技术有限公司对验收检测结果负责，建设单位中山市天图精细化工有限公司对验收报告结论负责。
验收监测报告完成时间	2025 年 4 月
提出验收意见的方式和时间	召开验收会议：2025 年 4 月 26 日

验收意见的结论	项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，经对照不属于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条中规定的不提出验收合格意见的情形，该项目可以通过竣工环境保护验收。
---------	--

1.4 公众反馈意见及处理情况

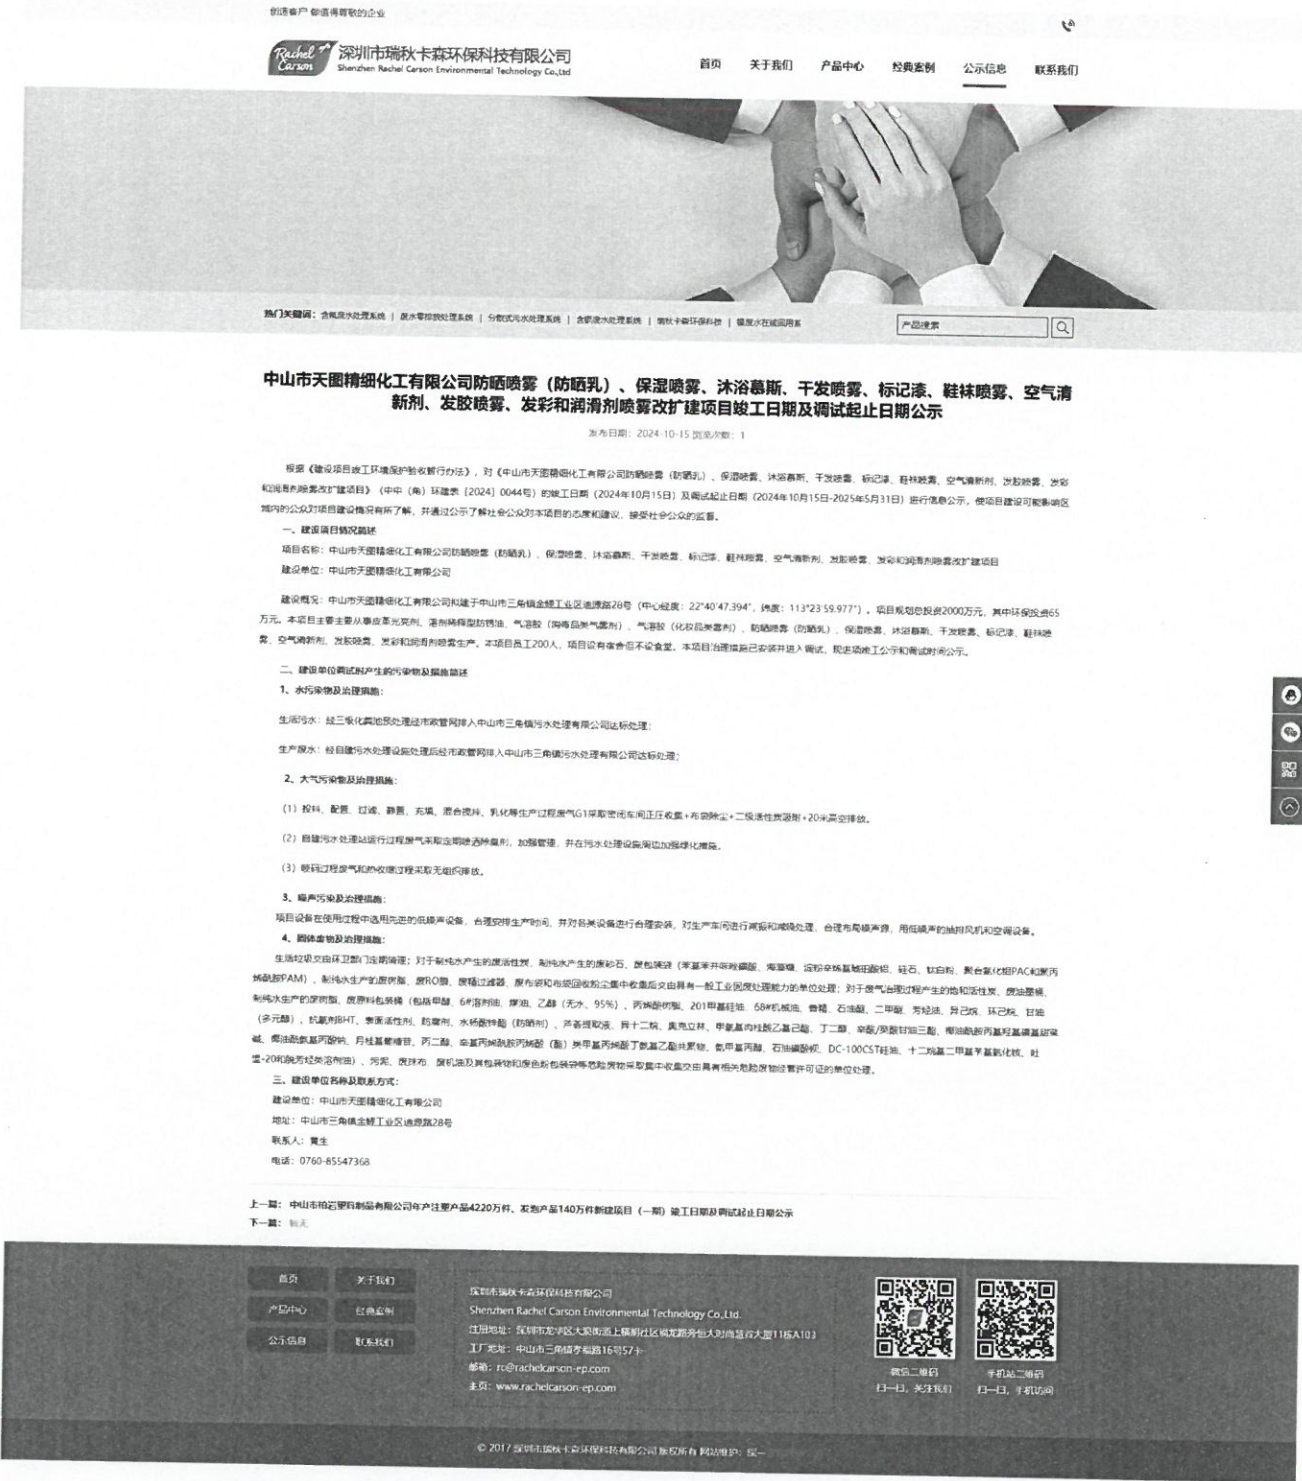


图 1 建设项目信息公开情况

本项目设计、施工和验收期间是否收到过公众反馈意见或投诉。

2、其他环境保护措施的落实情况

2.1、制度措施落实情况

2.1.1、环保组织机构及规章制度

本项目环保组织机构及规章制度主要内容一览表见表 2.

表 2 环保组织机构及规章制度主要内容一览表

项目	内容
环保组织结构	成立了环保组织机构,由厂长兼任环保负责人并设兼职环保员 1 名, 全面负责厂区环境保护工作。
环保设施调试制度	车间主任负责环保设施调试及日常运行维护
环保设施日常运行维护	环保负责人负责环境管理台账记录
环境管理台账记录要求	
运行维护费用保障计划	环保负责人负责运行维护费用、监测费用, 并列入年度开支计划。

2.1.2、环境风险防范措施

本项目已按要求编制了突发环境事件应急预案并备案, 备案编号442000-2025-0020-L。

2.1.3 环境监测计划

本项目已经按环评文件及审批决定要求制定环境监测计划, 并按要求进行环境监测。

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域消减及淘汰落后产能: 建设项目不涉及区域内消减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

(2) 防护距离控制及居民搬迁: 本项目不涉及防护距离控制及居民搬迁。

(3) 其他措施落实情况: 无。

3、整改工作情况

根据验收意见, 建设项目竣工验收合格, 各项环保措施已落实到位, 无需整改。

中山市天图精细化工有限公司
2025年4月26日
